
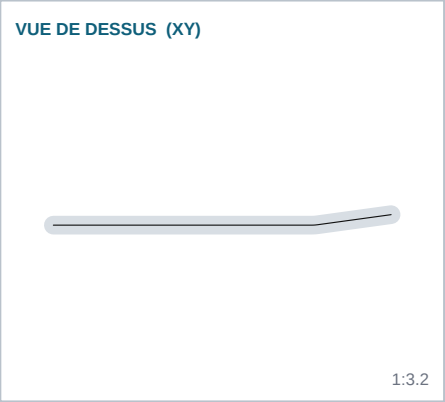
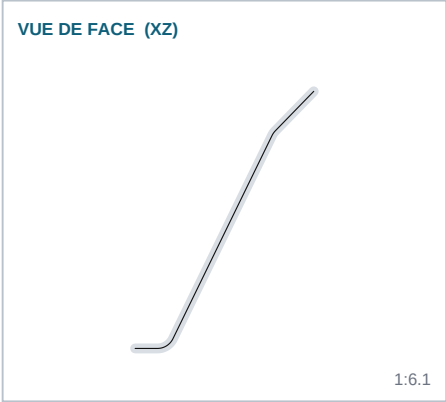


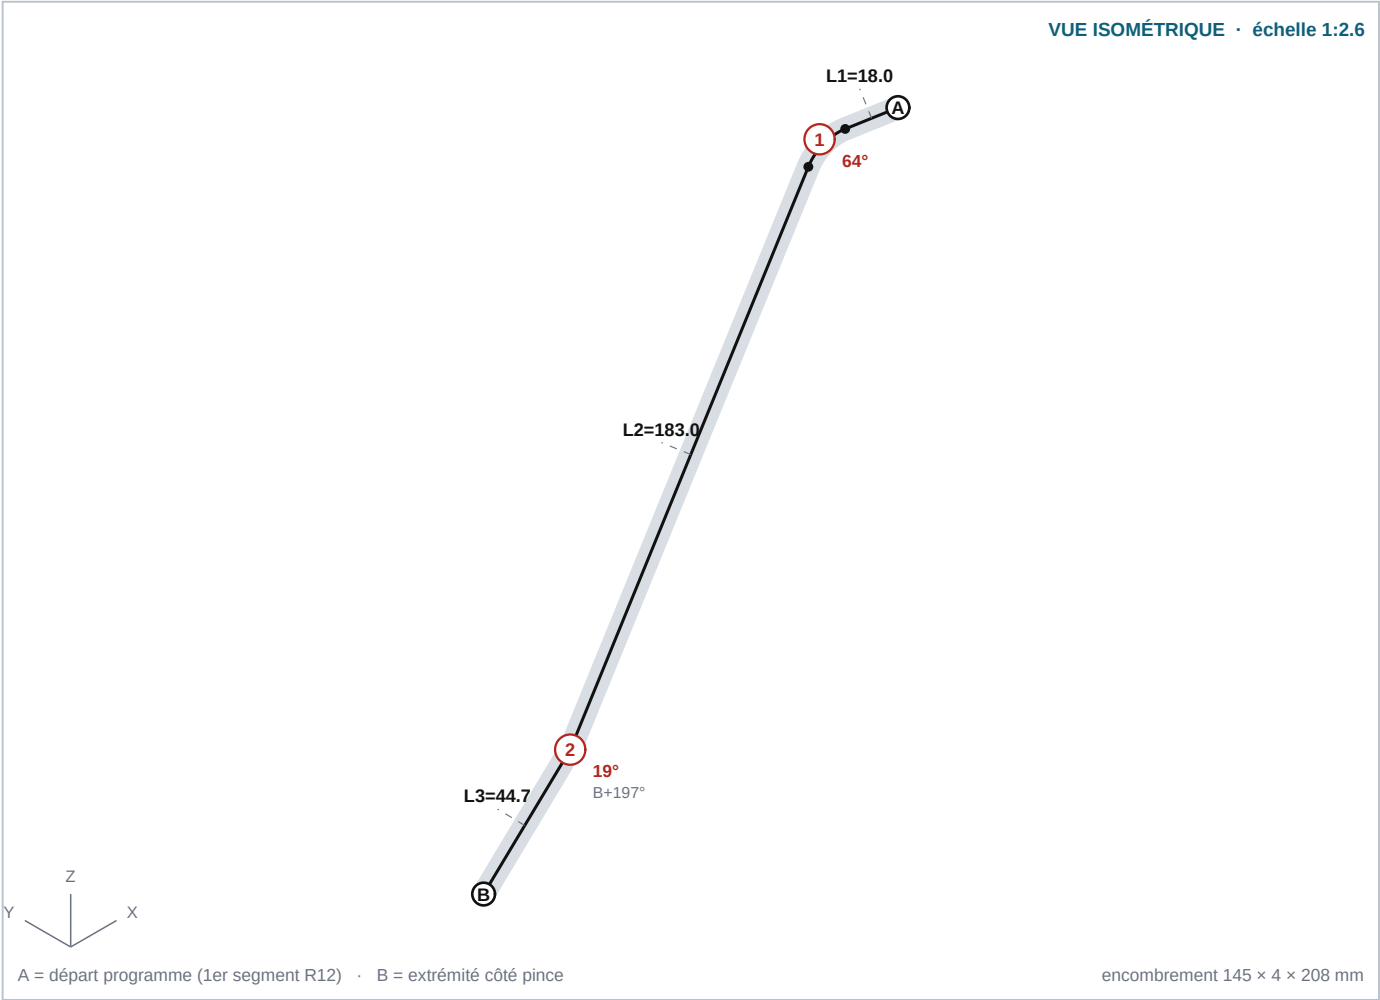

MATIÈRE			
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6		
Code BSA	293 421 008		
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa		
Ø extérieur	8 mm		
Ø intérieur	6 mm		
Épaisseur paroi	1 mm		
DÉBIT			
Longueur développée R6	265 mm		
Recoupe départ / arrivée	aucune		
Longueur à débiter	265 mm		
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc		
Développé recalculé	266.0 mm		
CINTRAGE			
Rayon de fibre neutre Rm	14 mm		
Nombre de coudes	2		
Somme des angles	83°		
Rotation B positive	horaire vue de l'aval		
Faux pli à 0°	aucun		
EXTRÉMITÉS			
A — départ	—		
B — arrivée	—		
PLAN DE FABRICATION			
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026			
REPÈRE	409		
Programme	792_JV-409		
Liste / lot	0792-0002-JV		
LFT	exemple_LFT		
Groupe	EXEMPLE		
Machine	LFT		
Désignation	—		
Échelle	1:2.6	Outillage	L58
Indice	A	Format	A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE		CONFORME	

DONNÉES DE FABRICATION

repère 409 · programme 792_JV-409 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	18.0	0	64	65	14	33.6
2	183.0	+197	19	19	14	221.3
fin	44.7	—	—	—	—	266.0

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	26.75	0.00	0.00
P2 — sommet 2	111.83	0.00	174.45
B — arrivée	144.52	4.48	208.04

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L3 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

1. Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
2. La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
3. La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
4. La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
5. Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
6. Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
7. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- INFO

parseur — retour elastique retire : 1° au total sur 1 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO

controle_DS — dernier segment calcule 44.74 mm contre DS=45 (-0.26 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 409
(MASTERCUT 1.7/2.1/1.65, Ø8, SECTEUR, L=265, ds=45)
L58
L1 R1=155 R4=20 R6=265 R7=2 R12=18 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=65 R7=0
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-148 B197
N2 L3 R15=19 R41=14 R43=300
M30
